


第1期施設

事前作業 《配管・タンク等
から液抜き・洗浄》

PCB 除去分別 《一部残存した高濃度 PCB
汚染箇所を除去しました》

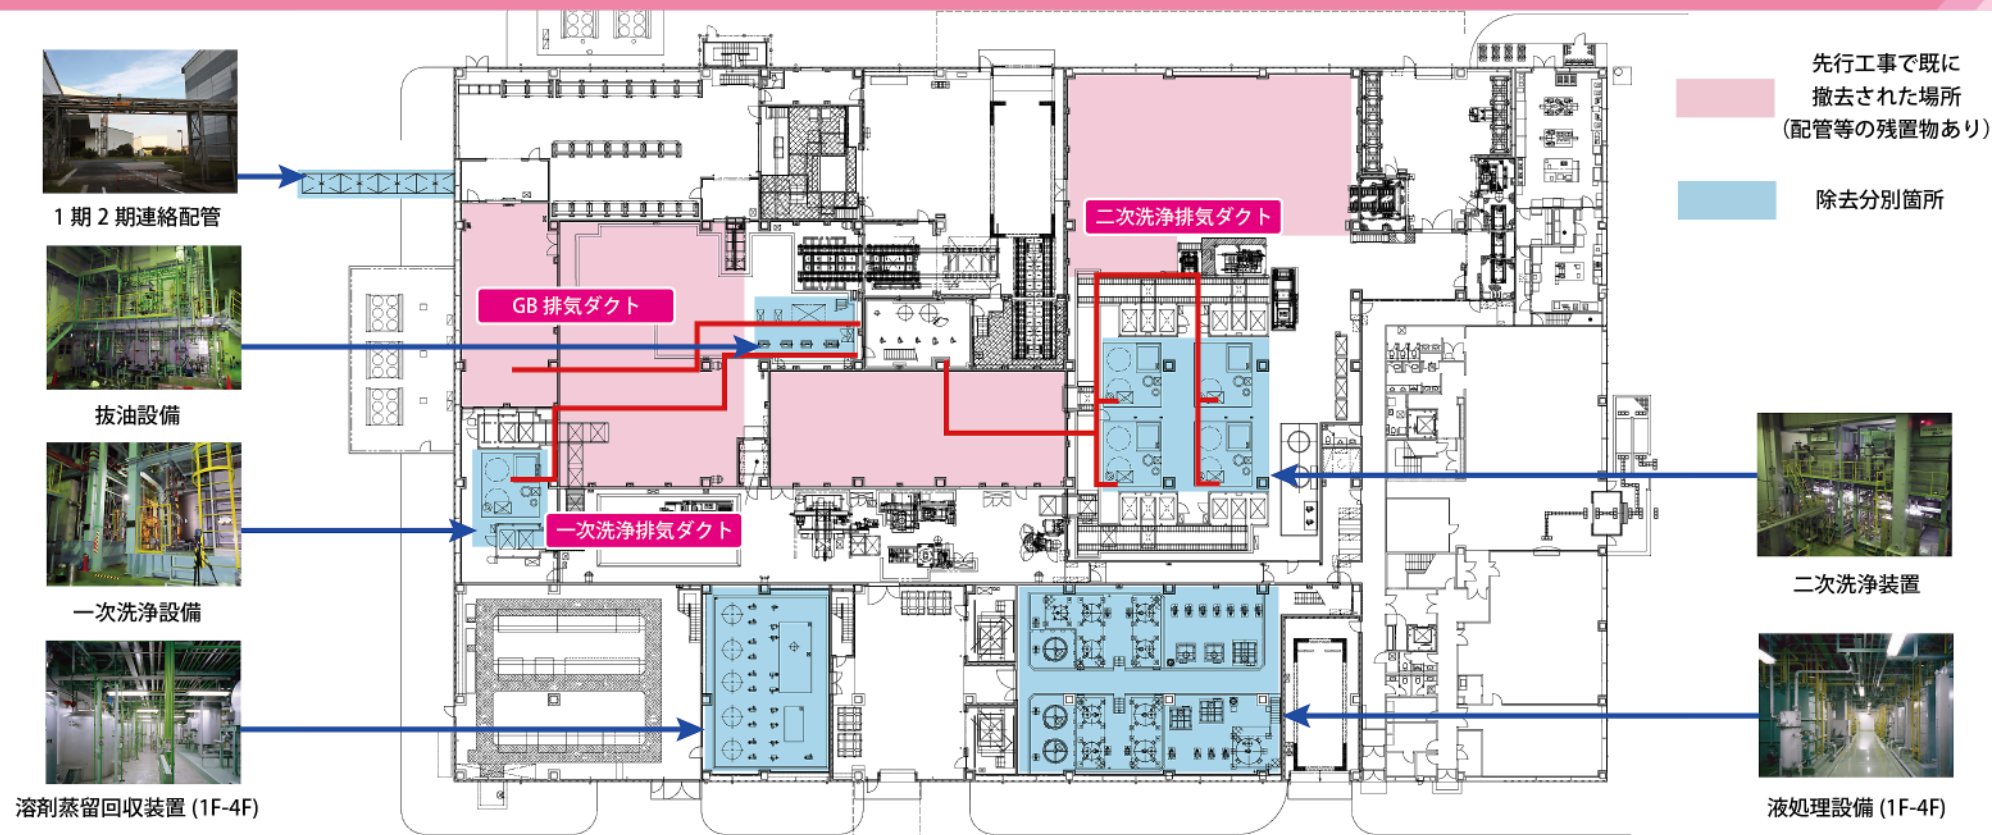

溶剤蒸留回収室の除去分別実施状況

工期：令和4年9月20日～10月29日

溶剤蒸留回収室は、塔槽類が配管で接続された設備で、1～4階に設置されています。除去分別のための撤去は、1階から着手して上層階に向かって行いました。配管・バルブ・ポンプ等に加え、付属する計装機器も撤去範囲としました。



液処理室の除去分別実施状況

工期：令和4年10月13日～12月28日

液処理室は、塔槽・ポンプ類が配管で接続された設備で、1系・2系・共通系と分れて1～4階に配置されています。除去分別のための撤去は、系統別に1階から上層階に向かって撤去を行いました。配管・バルブ・ポンプ等に加え、付属する計装機器も撤去範囲としました。



1～2期連絡配管の除去分別実施状況

工期：令和4年10月13日～11月5日

連絡配管は、1期と2期施設間の20mを渡る9本x30mの配管です。1期・2期それぞれで切断養生し、1期側へ引き込んで切断養生した後に外へ引き戻して吊り下ろした後1期施設内に運搬しました。

