


コンデンサー解体設備、及び鉄心コイル破碎・分別設備の 先行解体撤去の実施状況

1) 工事対象範囲

コンデンサー解体設備 【先行解体撤去対象】

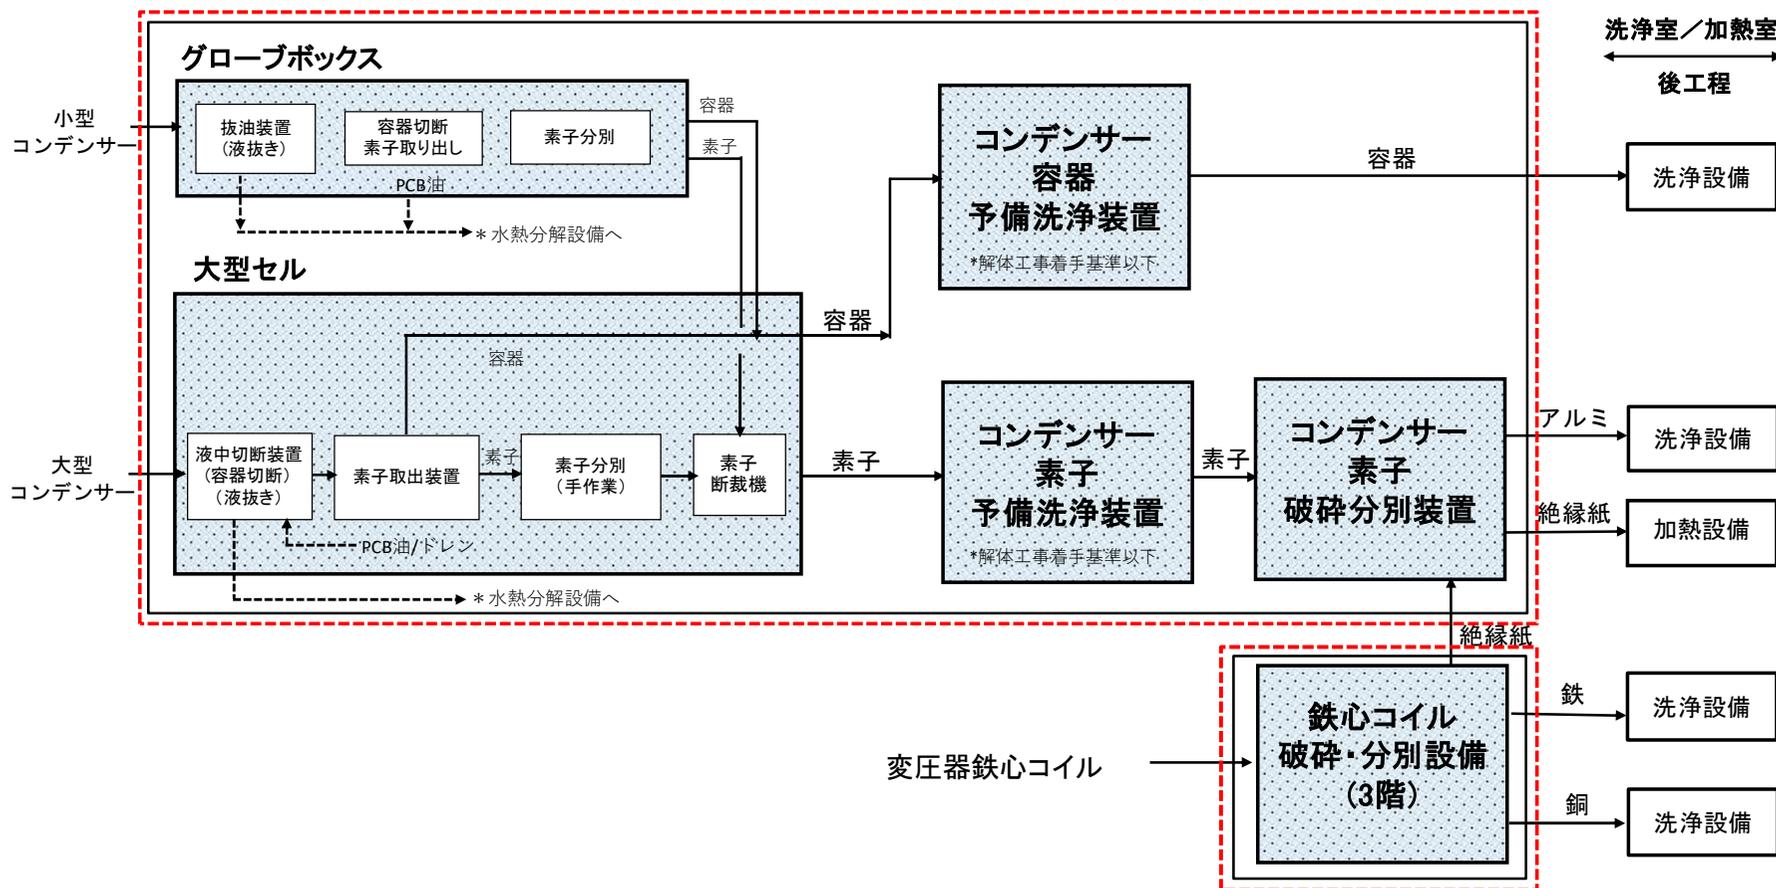

鉄心コイル破碎・分別設備 【先行解体撤去対象】

コンデンサー解体設備、及び鉄心コイル破砕・分別設備の 先行解体撤去の実施状況

2) 各作業・工事の実施状況・予定

・コンデンサー解体設備

作業・工事	実施期間	2025年3月時点の状況
洗浄作業	2024年4月～2025年2月	終了
付着状況調査	2024年9月～2025年2月	終了
PCB除去分別	2025年2月～2025年9月	実施中
解体撤去工事	2025年10月～2026年9月	実施予定

・鉄心コイル破砕・分別設備

作業・工事	実施期間	2025年3月時点の状況
付着状況調査	2024年9月	終了
PCB除去分別	2025年2月～2025年9月	実施中
解体撤去工事	2025年10月～2026年9月	実施予定

コンデンサー解体設備、及び鉄心コイル破砕・分別設備の 先行解体撤去の実施状況


3) 洗浄作業

- ・各設備・装置の洗浄作業は以下の方法で実施

設備・装置		機器等の外表面	配管・タンク等の内面
コン デ ン サ ー 解 体 設 備	大型セル	温水 + 絶縁油による高圧洗浄	絶縁油による通液洗浄
	グローブボックス	絶縁油によるスプレー洗浄	
	容器予備洗浄装置	洗浄対象外	操業停止時の洗浄運転により、解体工事着手基準以下を確認済み
	素子予備洗浄装置		
素子破砕分別装置	洗浄対象外 (洗浄対象物 無し)		
鉄心コイル破砕・分別設備			

コンデンサー解体設備、及び鉄心コイル破碎・分別設備の 先行解体撤去の実施状況

4) 洗浄作業の状況 (大型セル)

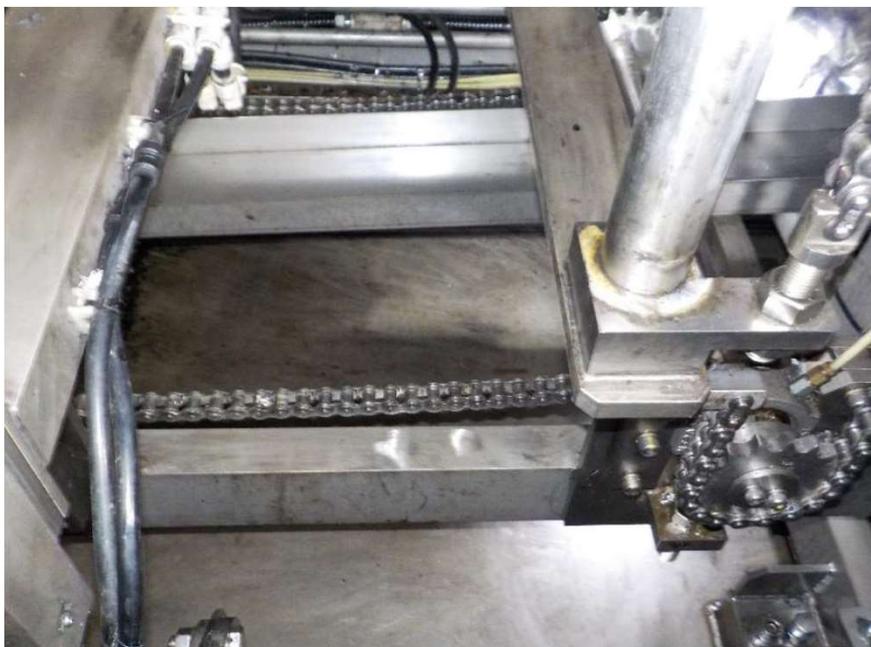

大型セルの内部 (清掃後)



大型セル内の機器の洗浄作業の状況

コンデンサー解体設備、及び鉄心コイル破碎・分別設備の 先行解体撤去の実施状況

5) コンデンサー解体設備の除去分別作業の状況 (2025年3月時点)



除去分別前



除去分別後

6) 今後の予定

コンデンサー解体設備及び鉄心コイル破碎分別設備とも、PCBの除去分別作業終了後、2025年10月から解体撤去工事を開始予定(2026年9月終了予定)
