


土壌貯蔵施設（双葉③工区）における 空間線量率の測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞



☆: 施設の位置

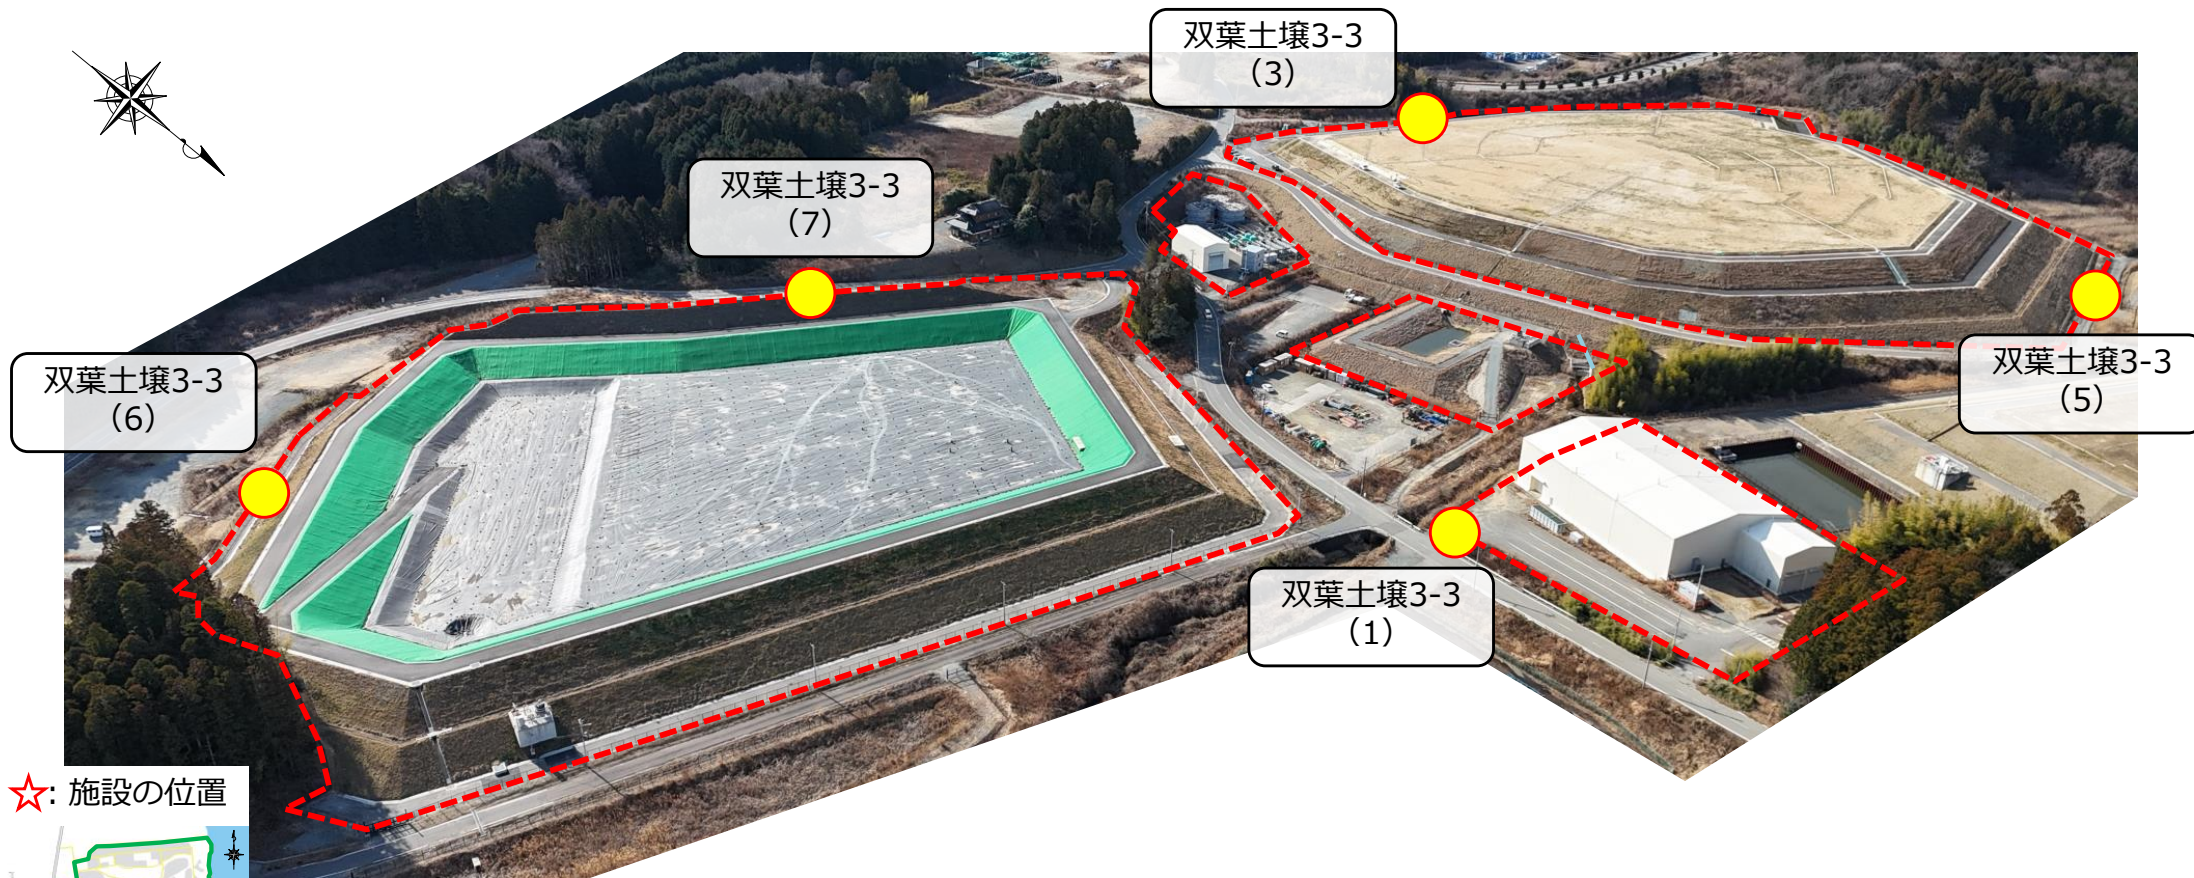

【 凡例 】

● : 空間線量率測定地点

土壤貯蔵施設(双葉③工区)における 空間線量率の測定結果(月次測定)


＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

地点 日付	双葉土壌3-3(1)	双葉土壌3-3(3)	双葉土壌3-3(5)	双葉土壌3-3(6)	双葉土壌3-3(7)
(工事前 2018年6月21日)	0.63	1.05	0.73	0.21 (2020年8月22日)	0.27 (2020年8月22日)
(貯蔵前 2019年12月21日)	0.16	0.25	0.20	0.15 (2021年12月16日)	0.15 (2021年12月16日)
2026年9月2日	0.13	0.21	0.17	0.17	0.17

凡例 工事前:施設造成工事開始前 貯蔵前:施設完成後、分別土壌搬入前

土壌貯蔵施設（双葉③工区）における 周辺環境及び作業環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞

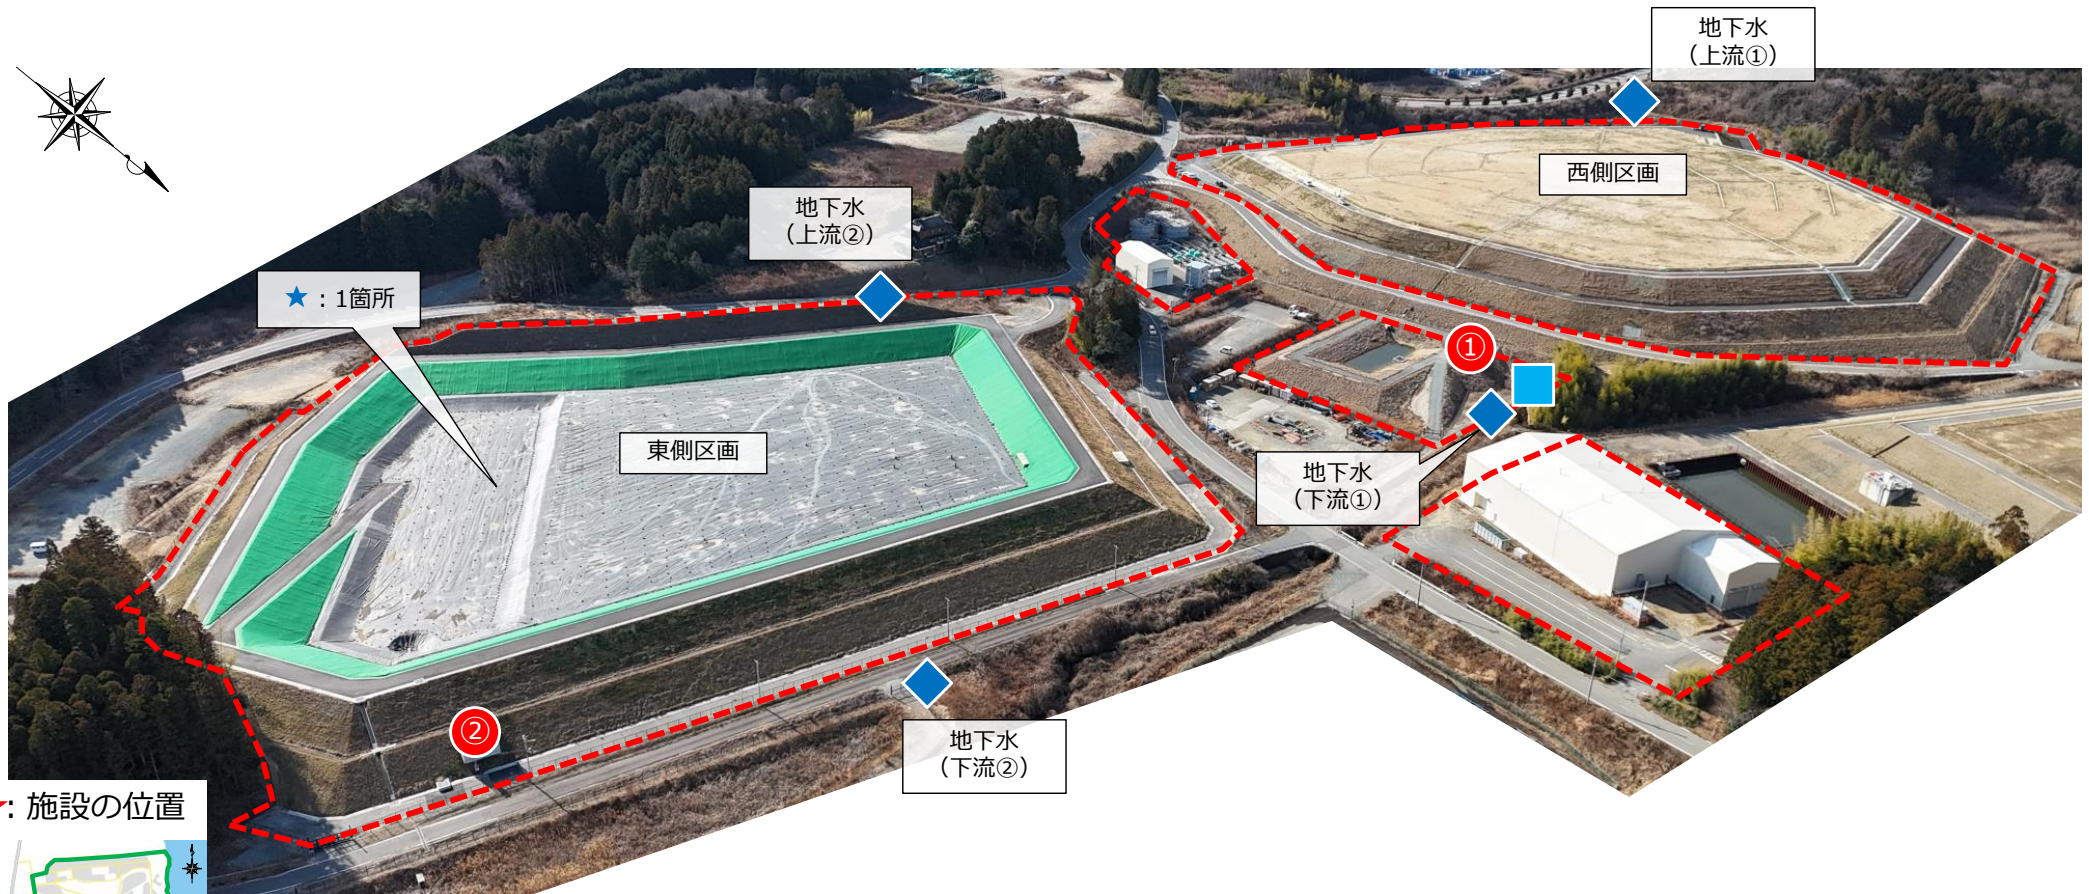

【凡例】

◆ : 地下水（井戸）中の電気伝導率等、放射能濃度

● : 地下水（集排水設備）中の放射能濃度

■ : 放流先河川の放射能濃度

★ : 空間線量率（作業環境）

--- : 敷地境界線

土壌貯蔵施設（双葉③工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年8月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	18
	2026/8/21 (貯蔵中)	24
上流②	2021/12/18 (稼働前)	20
	2026/8/21 (貯蔵中)	22
下流①	2019/12/24 (稼働前)	22
	2026/8/21 (貯蔵中)	22
下流②	2021/12/16 (稼働前)	49
	2026/8/21 (貯蔵中)	40

測定地点	測定項目 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	8.1
	2026/8/21 (貯蔵中)	6.6
上流②	2021/12/18 (稼働前)	14
	2026/8/21 (貯蔵中)	8.3
下流①	2019/12/24 (稼働前)	7.8
	2026/8/21 (貯蔵中)	14
下流②	2021/12/16 (稼働前)	52
	2026/8/21 (貯蔵中)	24

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	ND	ND
	2026/8/21 (貯蔵中)	ND	ND
上流②	2021/12/21 (稼働前)	ND	ND
	2026/8/21 (貯蔵中)	ND	ND
下流①	2019/12/24 (稼働前)	ND	ND
	2026/8/21 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2021/12/16 (稼働前)	ND	ND
	2026/8/21 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
集排水設備①	2019/12/20 (稼働前)	ND	ND
	2026/8/6 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2021/12/16 (稼働前)	ND	ND
	2026/8/6 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/12/17 (稼働前)		ND	ND
2026/8/21 (貯蔵中)		ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度/60 + セシウム137の濃度/90 ≤ 1

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 測定日	空間線量率 (μSv/h)
東側区画	2026/8/5 (貯蔵中)	2.82

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。

浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊④工区）の浸出水処理施設において実施。

土壌貯蔵施設（双葉③工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年7月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	18
	2026/7/7 (貯蔵中)	23
上流②	2021/12/18 (稼働前)	20
	2026/7/7 (貯蔵中)	22
下流①	2019/12/24 (稼働前)	22
	2026/7/7 (貯蔵中)	22
下流②	2021/12/16 (稼働前)	49
	2026/7/7 (貯蔵中)	40

測定地点	測定項目 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	8.1
	2026/7/7 (貯蔵中)	4.8
上流②	2021/12/18 (稼働前)	14
	2026/7/7 (貯蔵中)	13
下流①	2019/12/24 (稼働前)	7.8
	2026/7/7 (貯蔵中)	6.4
下流②	2021/12/16 (稼働前)	52
	2026/7/7 (貯蔵中)	25

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	ND	ND
	2026/7/7 (貯蔵中)	ND	ND
上流②	2021/12/21 (稼働前)	ND	ND
	2026/7/7 (貯蔵中)	ND	ND
下流①	2019/12/24 (稼働前)	ND	ND
	2026/7/7 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2021/12/16 (稼働前)	ND	ND
	2026/7/7 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
集排水設備①	2019/12/20 (稼働前)	ND	ND
	2026/7/7 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2021/12/16 (稼働前)	ND	ND
	2026/7/7 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/12/17 (稼働前)	ND	ND
2026/7/7 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度/60 + セシウム137の濃度/90 ≤ 1

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 測定日	空間線量率 (μSv/h)
東側区画	2026/7/22 (貯蔵中)	2.95

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。

浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊④工区）の浸出水処理施設において実施。

土壌貯蔵施設（双葉③工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年6月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	18
	2026/6/9 (貯蔵中)	23
上流②	2021/12/18 (稼働前)	20
	2026/6/9 (貯蔵中)	24
下流①	2019/12/24 (稼働前)	22
	2026/6/9 (貯蔵中)	25
下流②	2021/12/16 (稼働前)	49
	2026/6/9 (貯蔵中)	41

測定地点	測定項目 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	8.1
	2026/6/9 (貯蔵中)	5.2
上流②	2021/12/18 (稼働前)	14
	2026/6/9 (貯蔵中)	16
下流①	2019/12/24 (稼働前)	7.8
	2026/6/9 (貯蔵中)	7.9
下流②	2021/12/16 (稼働前)	52
	2026/6/9 (貯蔵中)	29

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	ND	ND
	2026/6/9 (貯蔵中)	ND	ND
上流②	2021/12/21 (稼働前)	ND	ND
	2026/6/9 (貯蔵中)	ND	ND
下流①	2019/12/24 (稼働前)	ND	ND
	2026/6/9 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2021/12/16 (稼働前)	ND	ND
	2026/6/9 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
集排水設備①	2019/12/20 (稼働前)	ND	ND
	2026/6/9 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2021/12/16 (稼働前)	ND	ND
	2026/6/9 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/12/17 (稼働前)		ND	ND
2026/6/9 (貯蔵中)		ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度/60 + セシウム137の濃度/90 ≤ 1

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 測定日	空間線量率 (μSv/h)
東側区画	2026/6/12 (貯蔵中)	2.93

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。

浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊④工区）の浸出水処理施設において実施。

土壌貯蔵施設（双葉③工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年5月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	18
	2026/5/12 (貯蔵中)	33
上流②	2021/12/18 (稼働前)	20
	2026/5/12 (貯蔵中)	25
下流①	2019/12/24 (稼働前)	22
	2026/5/12 (貯蔵中)	22
下流②	2021/12/16 (稼働前)	49
	2026/5/12 (貯蔵中)	47

測定地点	測定項目 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	8.1
	2026/5/12 (貯蔵中)	12
上流②	2021/12/18 (稼働前)	14
	2026/5/12 (貯蔵中)	20
下流①	2019/12/24 (稼働前)	7.8
	2026/5/12 (貯蔵中)	11
下流②	2021/12/16 (稼働前)	52
	2026/5/12 (貯蔵中)	42

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	ND	ND
	2026/5/12 (貯蔵中)	ND	ND
上流②	2021/12/21 (稼働前)	ND	ND
	2026/5/12 (貯蔵中)	ND	ND
下流①	2019/12/24 (稼働前)	ND	ND
	2026/5/12 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2021/12/16 (稼働前)	ND	ND
	2026/5/12 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
集排水設備①	2019/12/20 (稼働前)	ND	ND
	2026/5/12 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2021/12/16 (稼働前)	ND	ND
	2026/5/12 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/12/17 (稼働前)	ND	ND
2026/5/12 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度/60 + セシウム137の濃度/90 ≤ 1

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 測定日	空間線量率 (μSv/h)
東側区画	2026/5/11 (貯蔵中)	2.96

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。

浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊④工区）の浸出水処理施設において実施。

土壌貯蔵施設（双葉③工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年4月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	18
	2026/4/9 (貯蔵中)	32
上流②	2021/12/18 (稼働前)	20
	2026/4/9 (貯蔵中)	24
下流①	2019/12/24 (稼働前)	22
	2026/4/9 (貯蔵中)	22
下流②	2021/12/16 (稼働前)	49
	2026/4/9 (貯蔵中)	48

測定地点	測定項目 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	8.1
	2026/4/9 (貯蔵中)	10
上流②	2021/12/18 (稼働前)	14
	2026/4/9 (貯蔵中)	17
下流①	2019/12/24 (稼働前)	7.8
	2026/4/9 (貯蔵中)	9.2
下流②	2021/12/16 (稼働前)	52
	2026/4/9 (貯蔵中)	34

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流①	2019/12/24 (稼働前)	ND	ND
	2026/4/9 (貯蔵中)	ND	ND
上流②	2021/12/21 (稼働前)	ND	ND
	2026/4/9 (貯蔵中)	ND	ND
下流①	2019/12/24 (稼働前)	ND	ND
	2026/4/9 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2021/12/16 (稼働前)	ND	ND
	2026/4/9 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
集排水設備①	2019/12/20 (稼働前)	ND	ND
	2026/4/7 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2021/12/16 (稼働前)	ND	ND
	2026/4/7 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定日	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/12/17	(稼働前)	ND	ND
2026/4/9	(貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度/60 + セシウム137の濃度/90 ≤ 1

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 測定日	空間線量率 (μSv/h)
東側区画	2026/4/17 (貯蔵中)	2.95

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。

浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊④工区）の浸出水処理施設において実施。
